Einfamilienhaus

Stichtag: 15.04.05 08:00
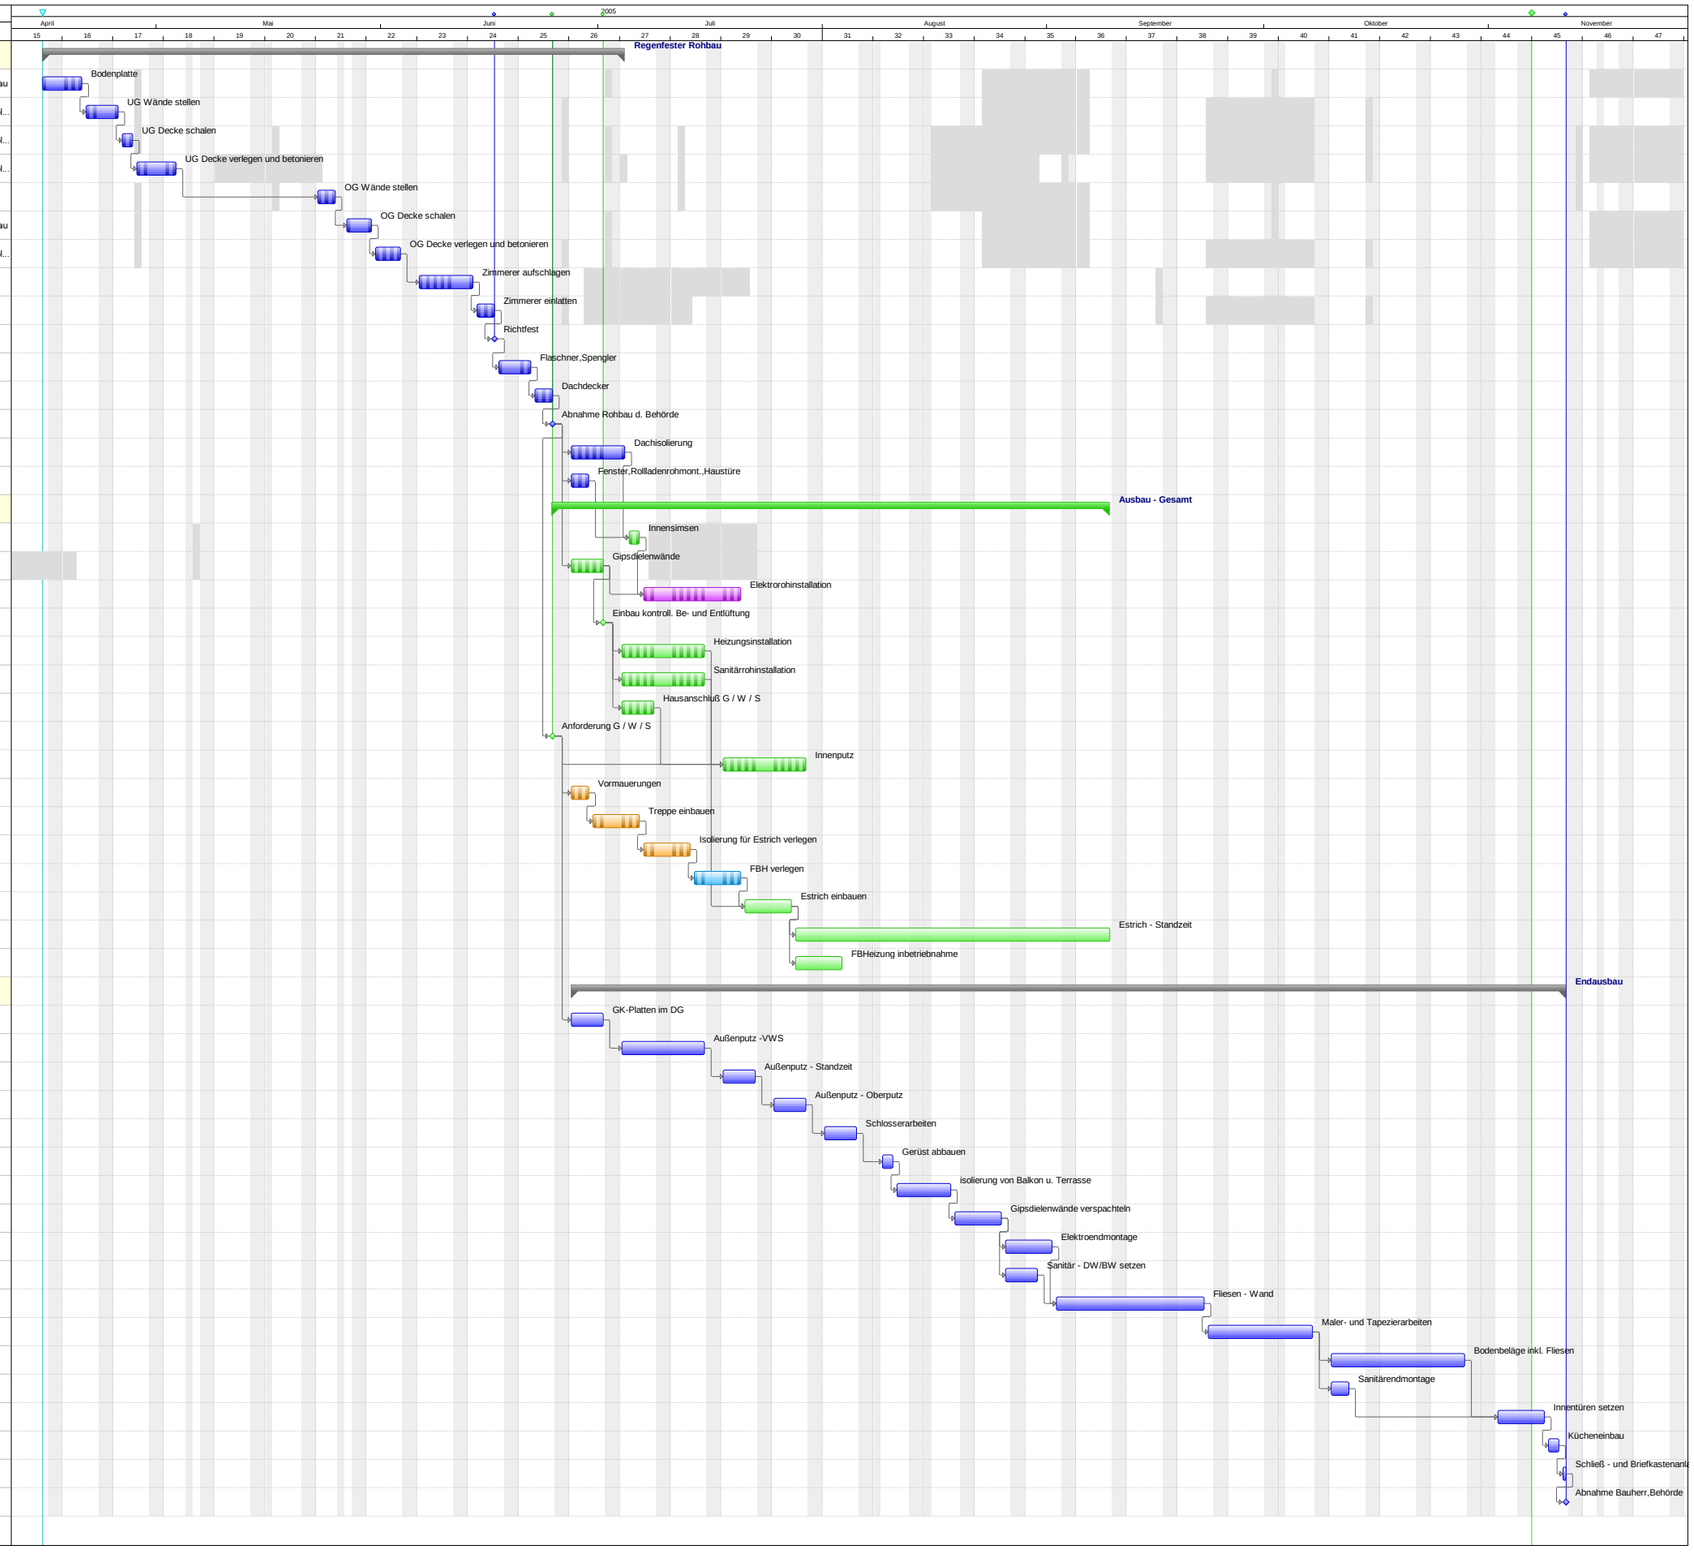
Nr.	Name	Auf... Ph	Dauer Std	Anfang	Ende	Rollen
1	**Regenfester Rohbau**	**1120**	**432**	**15.04.05 08:00**	**04.07.05 17:00**	
1.1	Bodenplatte	96	32	15.04.05 08:00	20.04.05 17:00	Betonbauer - Beton- u. Stahlbetonbauermeister/in; Betonbauer - Polier/in - Beton-, Stahlbetonbau
1.2	UG Wände stellen	72	24	21.04.05 08:00	25.04.05 17:00	Bautechniker - Bauleiter/in; Betonbauer - Beton- u. Stahlbetonbauermeister/in; Betonbauer - Pol...
1.3	UG Decke schalen	96	16	26.04.05 08:00	27.04.05 17:00	Bautechniker - Bauleiter/in; Betonbauer - Beton- u. Stahlbetonbauermeister/in; Betonbauer - Pol...
1.4	UG Decke verlegen und betonieren	160	32	28.04.05 08:00	03.05.05 17:00	Bautechniker - Bauleiter/in; Betonbauer - Beton- u. Stahlbetonbauermeister/in; Betonbauer - Pol...
1.5	OG Wände stellen	48	24	23.05.05 08:00	25.05.05 17:00	Betonbauer - Beton- u. Stahlbetonbauermeister/in; Maurer - Bauhelfer/in - Hochbau
1.6	OG Decke schalen	48	16	27.05.05 08:00	30.05.05 17:00	Betonbauer - Beton- u. Stahlbetonbauermeister/in; Betonbauer - Polier/in - Beton-, Stahlbetonbau
1.7	OG Decke verlegen und betonieren	128	32	31.05.05 08:00	03.06.05 17:00	Bautechniker - Bauleiter/in; Betonbauer - Beton- u. Stahlbetonbauermeister/in; Betonbauer - Pol...
1.8	Zimmerer aufschlagen	96	48	06.06.05 08:00	13.06.05 17:00	Maurer - Maurer/in
1.9	Zimmerer einlatten	48	24	14.06.05 08:00	16.06.05 17:00	Bautechniker - Bauleiter/in; Maurer - Maurer/in
1.10	Richtfest	8	0	16.06.05 17:00	16.06.05 17:00	
1.11	Flaschner,Spengler	72	24	17.06.05 08:00	21.06.05 17:00	Dachdecker - Dachdeckermeister/in
1.12	Dachdecker	96	24	22.06.05 08:00	24.06.05 17:00	Dachdecker - Dachdeckermeister/in
1.13	Abnahme Rohbau d. Behörde	8	0	24.06.05 17:00	24.06.05 17:00	
1.14	Dachisolierung	96	48	27.06.05 08:00	04.07.05 17:00	Isolierer, Abdichter - Isoliererhelfer/in
1.15	Fenster,Rollladenrohmont.,Haustüre	48	24	27.06.05 08:00	29.06.05 17:00	Raumausstatter - Raumausstatter/in
2	**Ausbau - Gesamt**	**640**	**424**	**24.06.05 17:00**	**09.09.05 17:00**	
2.1	Innensimsen	16	16	05.07.05 08:00	06.07.05 17:00	Stuckateure, Gipser, Verputzer - Stuckateur/in
2.2	Gipsdielenwände	80	40	27.06.05 08:00	01.07.05 17:00	Stuckateure, Gipser, Verputzer - Stuckateur/in
2.3	Elektrorohinstallation	80	80	07.07.05 08:00	20.07.05 17:00	Isolierer, Abdichter - Isoliererhelfer/in
2.4	Einbau kontroll. Be- und Entlüftung	8	0	01.07.05 17:00	01.07.05 17:00	
2.5	Heizungsinstallation	80	80	04.07.05 08:00	15.07.05 17:00	Bautechniker - Bauleiter/in
2.6	Sanitärrohinstallation	80	80	04.07.05 08:00	15.07.05 17:00	Bautechniker - Bauleiter/in
2.7	Hausanschluß G / W / S	40	40	04.07.05 08:00	08.07.05 17:00	Isolierer, Abdichter - Isoliererhelfer/in
2.8	Anforderung G / W / S	8	0	24.06.05 17:00	24.06.05 17:00	
2.9	Innenputz	80	80	18.07.05 08:00	29.07.05 17:00	Raumausstatter - Raumausstatter/in
2.10	Vormauerungen	24	24	27.06.05 08:00	29.06.05 17:00	Maurer - Bauhelfer/in - Hochbau
2.11	Treppe einbauen	40	40	30.06.05 08:00	06.07.05 17:00	Betonbauer - Polier/in - Beton-, Stahlbetonbau
2.12	Isolierung für Estrich verlegen	40	40	07.07.05 08:00	13.07.05 17:00	Isolierer, Abdichter - Isoliererhelfer/in
2.13	FBH verlegen	40	40	14.07.05 08:00	20.07.05 17:00	Stuckateure, Gipser, Verputzer - Stuckateur/in
2.14	Estrich einbauen	8	40	21.07.05 08:00	27.07.05 17:00	
2.15	Estrich - Standzeit	8	240	28.07.05 08:00	09.09.05 17:00	
2.16	FBHeizung inbetriebnahme	8	40	28.07.05 08:00	03.08.05 17:00	
3	**Endausbau**	**144**	**760**	**27.06.05 08:00**	**11.11.05 17:00**	
3.1	GK-Platten im DG	8	40	27.06.05 08:00	01.07.05 17:00	
3.2	Außenputz -VWS	8	80	04.07.05 08:00	15.07.05 17:00	
3.3	Außenputz - Standzeit	8	40	18.07.05 08:00	22.07.05 17:00	
3.4	Außenputz - Oberputz	8	40	25.07.05 08:00	29.07.05 17:00	
3.5	Schlosserarbeiten	8	40	01.08.05 08:00	05.08.05 17:00	
3.6	Gerüst abbauen	8	16	09.08.05 08:00	10.08.05 17:00	
3.7	isolierung von Balkon u. Terrasse	8	40	11.08.05 08:00	18.08.05 17:00	
3.8	Gipsdielenwände verspachteln	8	40	19.08.05 08:00	25.08.05 17:00	
3.9	Elektroendmontage	8	40	26.08.05 08:00	01.09.05 17:00	
3.10	Sanitär - DW/BW setzen	8	24	26.08.05 08:00	30.08.05 17:00	
3.11	Fliesen - Wand	8	120	02.09.05 08:00	22.09.05 17:00	
3.12	Maler- und Tapezierarbeiten	8	80	23.09.05 08:00	07.10.05 17:00	
3.13	Bodenbeläge inkl. Fliesen	8	120	10.10.05 08:00	28.10.05 17:00	
3.14	Sanitärendmontage	8	24	10.10.05 08:00	12.10.05 17:00	
3.15	Innentüren setzen	8	40	02.11.05 08:00	08.11.05 17:00	
3.16	Kücheneinbau	8	16	09.11.05 08:00	10.11.05 17:00	
3.17	Schließ - und Briefkastenanlage	8	8	11.11.05 08:00	11.11.05 17:00	
3.18	Abnahme Bauherr,Behörde	8	0	11.11.05 17:00	11.11.05 17:00
